

2026-K-2(中机创新科技)001

中机中联智慧工程管理平台 软件开发服务合同

甲方：中机中联工程有限公司

乙方：中机创新科技（重庆）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，经双方协商一致，甲方决定委托乙方承担部分中机中联智慧工程管理平台软件开发服务，特签订本合同。

第一条 项目基本情况

1.1 项目名称：中机中联智慧工程管理平台（以下简称“该平台”）

1.2 服务范围：协助甲方完成中机中联智慧工程管理平台开发任务。

第二条 服务内容及成果提交

2.1 乙方根据甲方提供的项目需求、设计文档资料完成开发和上线。

2.2 项目成果按要求在合同约定时间内全部移交，成果包含以下内容：

编号	交付物名称	子项名称	数量	单位	格式
1	源代码	本项目的开发项目工程包(可编译运行,并包含所有素材资源文件)		份	.jar
2	操作手册	本项目功能模块的操作说明文档			.pdf

第三条 项目进度及成果提交

甲方提供项目开发任务要求及相关必要资料，30日内提交全部服务成果，并在过程中配合在项目现场服务器进行成果部署。

第四条 服务费用

本合同服务费按固定总价包干，服务费用(含税率6%)总价为 280000 元（人民币大写：贰拾捌万元整），其中不含税(税率6%)金额为 264150.94 元，税额为 15849.06 元。

元。

服务费为含税价格，并包括乙方人工费用、办公通讯费用、利润、乙方赴项目现场的差旅费等完成合同约定全部工作内容所需所有费用，应缴税额由乙方自行缴纳。

第五条 本合同服务费支付的付款时间节点及比例见下表。

付费次序	付费比例	付费金额(元)	付款时间
第一次	70%		完成第一阶段和第二阶段建设内容 15 个工作日内
第二次	25%		初步验收后，15 个工作日内
第三次	5%		最后验收合格后，15 个工作日内

序号	阶段性节点	内容
1	一阶段开发完成	完成第一阶段开发任务，包括技术交底、施工日志、质量巡检、安全教育、安全技术交底、安全巡检 6 个功能。
2	二阶段开发完成	完成第二阶段开发任务，包括除第一阶段和第三阶段外的其他所有开发内容。
3	三阶段开发完成	完成第三阶段开发任务，包括开发项目大屏和数据看板。根据国产自主可控要求，完成系统的国产化部署和正式上线。

付款前，乙方应提供合法、有效的增值税专用发票，否则甲方有权暂缓支付任何费用，且不承担任何法律责任。

如甲方付款迟延，乙方同意给予 90 日的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由停止履行合同义务。如甲方在宽限期后，仍逾期付款的，根据法律规定甲方应承担逾期付款违约金或利息的，甲方按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1 年期）承担逾期付款利息，且累计承担的违约金及

利息不得超过本合同项下双方结算价款的 5%。

第六条 违约责任

6.1 乙方对提交的成果文件及本合同约定由其承担的服务内容的正确性全面负责。乙方对成果程序及文档出现的遗漏或错误部分，应无偿修改或补充并重新做出符合合同规定和质量要求的项目成果文件。

6.2 由于乙方质量、服务配合等达不到本合同及各阶段合同、任务书的要求，乙方应无条件按甲方任务书要求修改成果文件，若修改后仍无法满足甲方要求，甲方有权在任何阶段要求终止合同，乙方应退还甲方全部已付款项，并赔偿甲方合同金额 5% 的违约金。若乙方给甲方造成其他损失的，乙方还应赔偿甲方所产生的所有损失包括但不限于甲方另行委托第三方所产生的费用等。

6.3 乙方对甲方已确认的成果文件进行修改必须经过甲方同意，在提交甲方的成果文件修改通知中应注明修改原因，若乙方未知会甲方而擅自修改成果文件，造成甲方损失的，乙方应承担违约责任。

6.4 乙方不经甲方同意而擅自委托分包合同约定内容行为，甲方将拒绝接受该部分成果文件，乙方应退还甲方全部已付款项，并赔偿甲方合同金额 5% 的违约金，如违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

6.5 本合同履行期间，甲方未按本合同约定支付服务费，甲方按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1 年期）承担逾期付款利息，累计利息不超过应付未付总额的 5%）。

6.6 乙方应按照甲方的进度要求，按时将成果提交给甲方，否则，每逾期一天，按服务费总额的 2% 支付逾期违约金。逾期 10 天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方合同金额 5% 的违约金。以上违约金并罚。

第七条 由于不可抗力因素或建设单位终止合同，致使本合同无法履行时，本合同自动终止，双方应及时协商签订终止协议。

第八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，则以诉讼方式解决，争议解决法院为甲方所在地人民法院。

第九条 本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，自双方签盖章字之日起即生效。

附件 1. 保密协议

以下无正文。

甲方名称

中机中联工程有限公司

(盖章):

合同专用章

开户行: 中国建设银行重庆九龙坡石桥铺支行

地址: 重庆市九龙坡区渝州路887号

乙方名称

中机创新发展(重庆)有限公司

(盖章):

永勃赵

合同专用章

地址: 重庆市高新区含谷镇高龙大道延长段

377号8幢2层2号

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

或委托代理人(签字):

电话:

电话:

开户银行: 建行重庆九龙坡石桥铺支行

开户银行: 工商银行高科技金凤支行

银行账号: 5000 1045 0000 5988 8888

银行账号: 3100002409100076463

2016年5月19日

附件 1:

保密协议

鉴于乙方在本项目过程中, 已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料, 且因工程需要, 甲方需向乙方披露相关保密资料, 乙方承诺按照本协议的约定对上述资料予以保密。

为此, 甲乙双方根据《保密法》、《中华人民共和国民法典》等相关规定, 经自愿协商, 达成保密协议如下:

第一条 保密资料

(一) 甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业资料、技术资料、经营信息以及其他甲方尚未公开的资料;

(二) 在本项目实施过程中形成的任何分析、编辑、研究、服务成果、技术信息或其他文件资料。

(三) 以上资料包括书面的、口头的、图形的或其它任何形式的资料, 包括但数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

(四) 上述保密资料可以以数据、文字及记载上述内容的光盘、软件、图书等有形媒介体现, 也可通过法律法规认可的其他介质形式传递。

第二条 保密义务

(一) 乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密, 包括执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料, 采取至少不低于对自身保密信息之保护手段进行保密。

(二) 乙方保证在任何情况下, 除依照法律强制性的要求外, 不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容;

(三) 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定(包括按照传票、法院或政府处理程序)的要求而必需披露相关的保密资料, 乙方应当事先书面通知甲方, 同时, 乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播;

(四) 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为;

(五) 乙方只能为完成本项目而使用保密资料;

(六) 除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外, 乙方不能将保密资料透露给其它任何人, 包括不能在互联网、局域网公开正在制作参与投标或已经中标的涉及项目相关的资料; 在该等职员知悉、接触该保密资料前, 乙方应向其提示保密信息和保密资料的保密性及应承担的保密义务, 并促使该等职员履行与乙方同等的密义务;

(七) 乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造;

(八) 乙方必须给予参与的相关人员进行《中华人民共和国保密法》教育, 要求其参与本项工作之雇员严格遵守本协议规定, 若参与本项工作之雇员(包括已离职员工)违反本协议规定, 均视为乙方违反本协议约定, 并乙方应当依照本协议约定承担违约责任。

(九) 无论甲方在向乙方披露相关信息、资料或乙方接触、知悉相关资料, 或在资料形成过程中,

是否表明该资料为保密资料，乙方均应依照本协议约定履行保密义务，而无需甲方明确告知。

(十)如甲方要求乙方归还或销毁保密资料，乙方应立即归还或销毁保密资料，且有关销毁凭证应同时送交给甲方。

(十一)若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，乙方不得向该第三方披露任何甲方的保密资料；乙方应立即将甲方的保密资料归还，或根据甲方的要求予以销毁，同时送交甲方有关销毁凭证。除非事先获得甲方的书面同意，乙方不得继续使用该保密资料。

第三条 保密期限

乙方承担保密义务的期限自本协议签订之日起，至全部保密资料以合法方式为公众知悉之日止；不因项目的中止、终止、解除等而失去对乙方的约束力。

第四条 返还信息

(一)当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

(二)没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

(三)甲方有权随时对乙方承诺保密情况进行检查。

第五条 知识产权

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

第六条 违约责任

(一)乙方未履行本协议项下任何条款均将视为违约，应当赔偿甲方的所有损失，并向甲方支付本项目合同总金额的15%的违约金；

(二)投标前后在互联网或局域网公开投标结果的，甲方有权取消乙方中标资格，若已签订合同，甲方有权解除合同，一切损失均由乙方承担；

(三)乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播，所需费用及责任由乙方承担。

(四)乙方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。

第七条 争议解决

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 其他

(一)本协议中标题仅为阅读方便，在任何情况下不得作为对本协议内容的解释。

(二)本协议对双方及其权利义务继承人均有约束力。

(三)未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。

(四)本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其它条款仍应完全有效并应被执行。

(五)一方当事人没有或延迟行使本协议项下的任何权利或救济不构成对该权利的放弃，任何权

利的放弃必须以书面形式正式做出。

(六) 双方都承认，如有违本协议，因此而造成的损失将难以估量，并承诺：甲方可以向法院或有关部门申请保护措施，来保护自己的正当权利，该等权利的行使不影响其继续享有和行使其他权利和补偿权。

(七) 本协议及其附件(如有)构成了甲方和乙方之间就本协议项下相关事宜达成的全部和唯一的协议，并取代了一切先前达成的谅解、安排、约定或通信。

(八) 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。


(本页无正文，为签字盖章页)

中机中联工程有限公司
(1)
合同专用章
甲方：中机中联工程有限公司 (盖章)
开户行：中国建设银行重庆九龙坡石桥铺支行
账号：5000104500005988888
法定代表人： (签字或盖章)
5001030818350

或委托代理人： (签字或盖章)

乙方：中机创新科技发展(重庆)有限公司 (盖章)
合同专用章
永赵
法定代表人： (签名或盖章)
5001050156539
或委托代理人： (签名或盖章)

智慧工程管理平台系统图

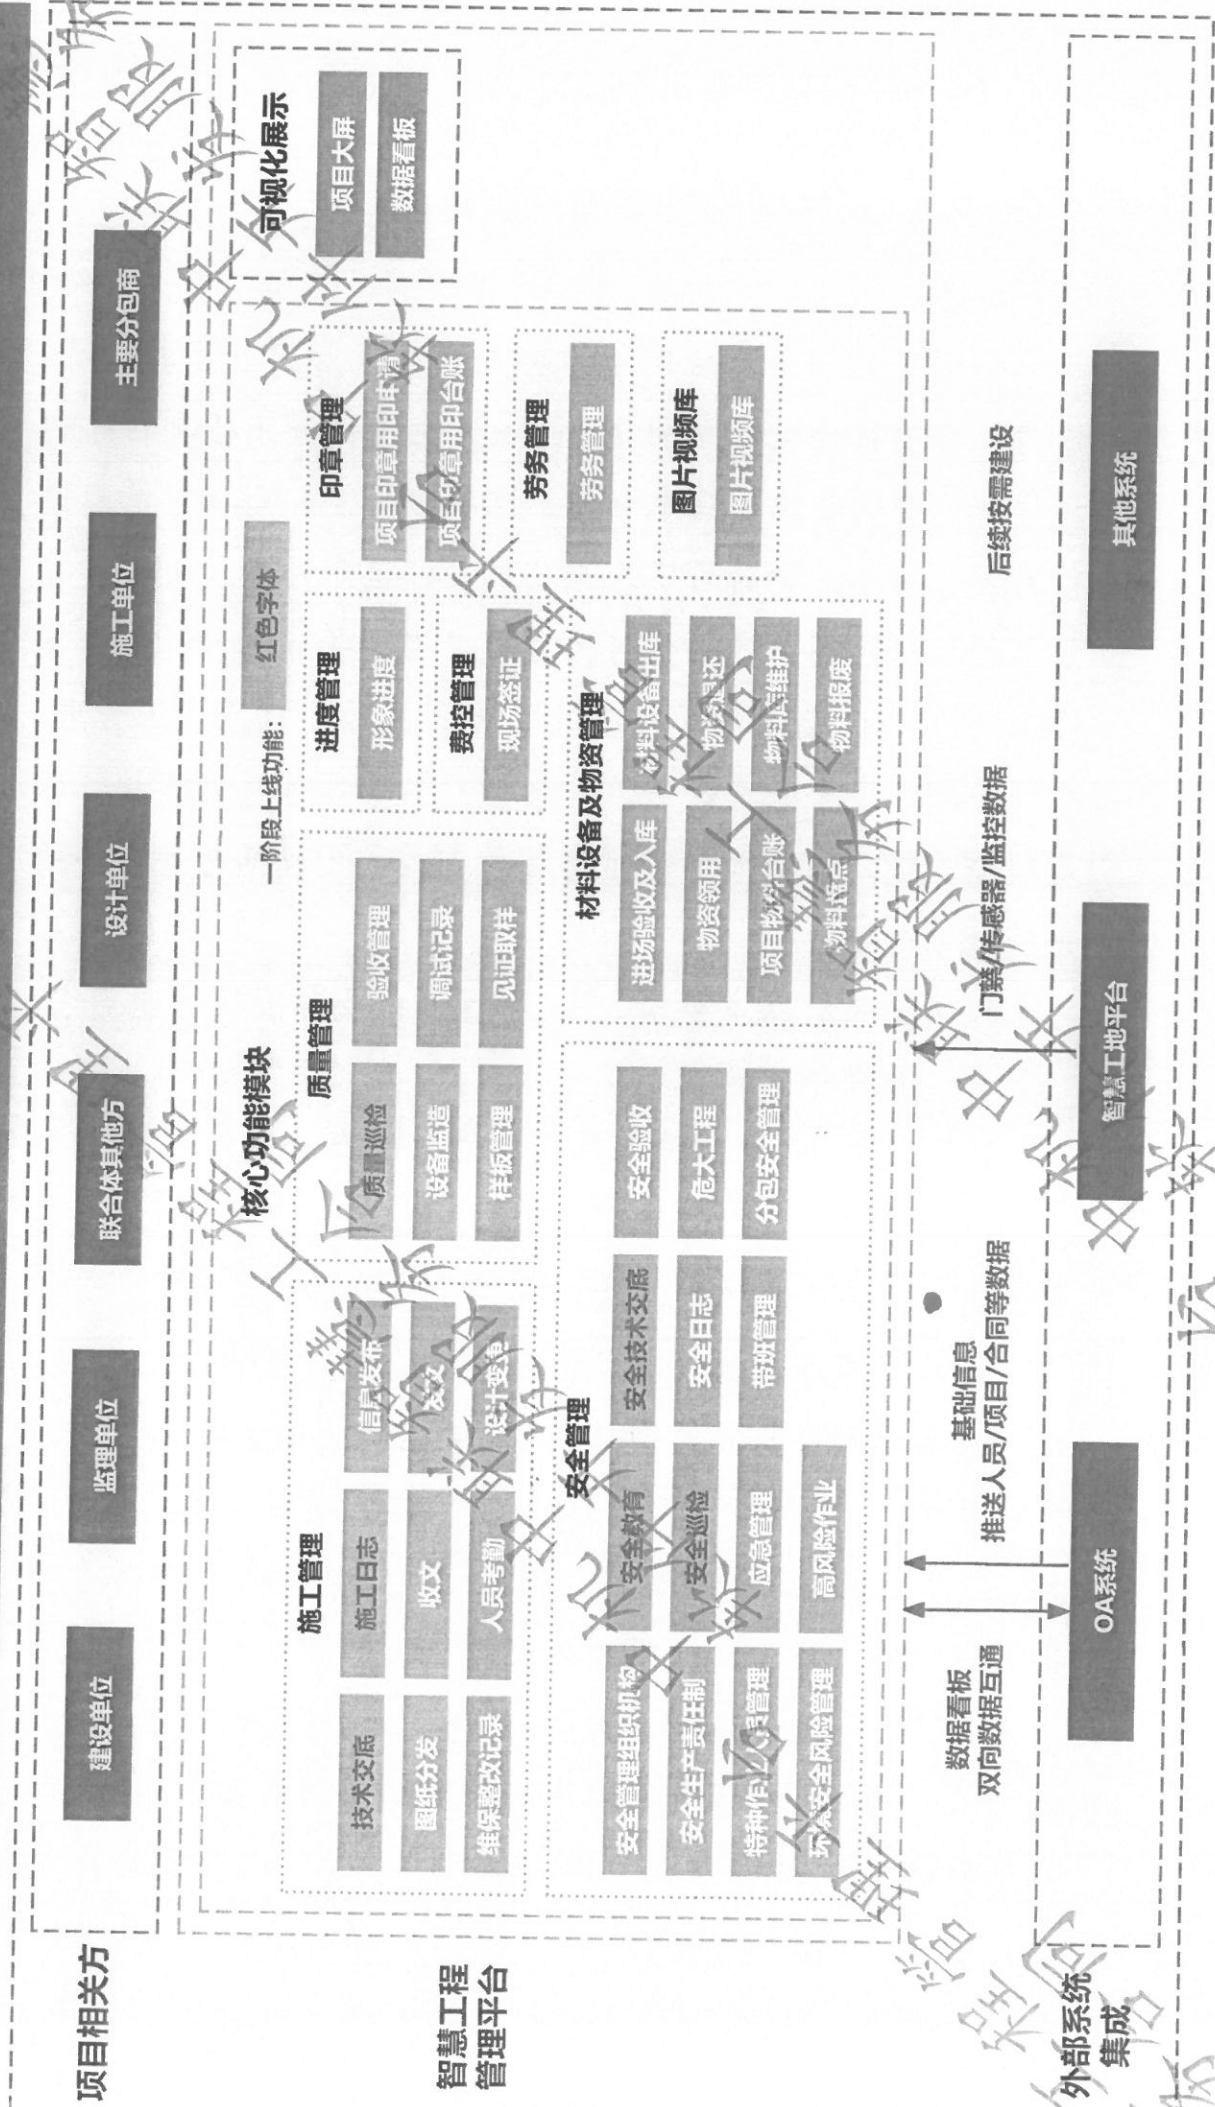

智慧工程管理平台功能需求

智慧工程管理平台定位为企业级的专业工程管理系统，作为工程项目全生命周期管理工具，主要处理工程项目执行过程中的资料收集、信息流转、流程审批，并对项目信息进行可视化展示，同时可实现与公司其他信息系统（如 OA 系统）的数据互通。该平台可覆盖项目相关各方（包括外部单位），支持 PC 端浏览器和手机端 APP 操作，包括施工管理、质量管理、安全管理、进度管理、费控管理等功能板块，以及数据看板、项目大屏等信息展示方式，还包括与此匹配的系统基础配置。

以下是系统基本要求、基础设置，以及各板块功能需求。

一、系统基本要求

1.1 支持 PC 端浏览器和手机端 APP 双端操作

应同时支持 PC 端和手机端，更好地适应项目现场的管理需求。支持手机拍照上传，支持手机传附件。

1.2 可实现与公司其他信息系统的数据互通

可实现与公司其他信息系统（包括但不限于 OA 系统）的数据互通。本平台可以从 OA 系统中调取项目信息、人员信息、分包合同信息等数据作为基础信息，也可调取 OA 系统中数据中台的项目汇总数据和明细数据，以及主要流程及其附件供查阅；同时平台生成的明细数据、汇总数据和相关资料也可以在 OA 系统等其他信息系统中进行调取和查阅。支持本平台流程和 OA 系统流程的打通。

支持“智慧工地平台”接入。和公司的电子档案库打通，本平台上传和生成的资料，可直接在电子档案库存档。

1.3 可按需对项目信息进行可视化展示

通过项目大屏、数据看板等接口，实现项目信息的归集及可视化展示。

1.4 满足国产自主可控要求，以及信息安全要求。

二、基本信息维护、角色及权限管理

2.1 项目基本信息

项目基本信息，可从 OA 系统中同步数据（经营管理-签入合同管理-合同登记），只选择部分需要的字段即可。同时项目需关联项目相关方。

2.2 项目相关方

进行项目相关方管理和维护。包括建设单位、监理单位、联合体其他方、设计单位、施工单位、主要分包商等。支持表格导入，信息添加一次入库即可，后续可以直接选择使用。由项目经理进行维护。其他项目相关方，如项目跟审、外审、审计、巡视等，如确需进系统查看，由职能管理部门提需求，后台管理员进行维护。

2.3 项目人员

包含项目相关方的主要管理人员。在此处创建人员名单及账号信息，后续可根据权限发起和审批流程。我方管理人员从 OA 系统中同步数据，包括人员基本信息和项目人员任命信息。外部单位人员信息需自行添加和维护。支持表格导入，信息添加一次入库即可，后续可以直接选择使用。由项

目经理进行维护。

2.4 角色及权限管理

针对不同的项目相关方及其人员岗位，设置相应的角色，对应不同的流程发起和审批的权限，以及查看权限。角色权限详见附件 1《角色权限表初版》(包含发起权限和审批权限)。

项目人员角色库以 OA 系统推送的项目人员任命数据为基础建立，支持在本平台进行手动维护。项目总负责人、项目经理、技术负责人、安全负责人等主要管理人员不能修改。

角色设置流程：项目启动时，由项目所在生产部门或项目经理提出申请，由后台管理人员进行初始设置。如后续有改动，提交调整申请后进行调整。

三、基本设置

3.1 时限约束

部分流程设置完成时限，即从发起流程的当天到结束流程，不能超过该时限。时限作为一个后台管理的配置，由后台管理人员设置。系统初期运行时设置为 7 天。

3.2 归档功能

时限未到可以自己点击归档，时限到了系统自动归档。归档后不能再修改。

3.3 工程标准物料库

在系统上线运行前，建立工程标准物料库，包含物料名称、规格型号、单位等标准化信息，覆盖建筑工程常见的材料、设备、物资等。

3.4 表单校验

所有的必填项如未填写，则进行提示，且无法进入下一步流程。

3.5 提醒及预警功能

可进行待办项提醒、流程未定期闭合提醒等。首页显示该角色及账号的任务以及完成情况。随系统开发及上线应用，将更新更多的预警机制，与OA系统同步进行预警。

3.6 流程配置

配置为标准流程，统一要求。如部分项目流程需调整，则由后台进行维护。

3.7 项目流程归集

以项目为单位进行流程归集，建立类似贯标系统和电子档案库的树形结构，在节点有流程和数据，显示流程的数量。重要节点做标记。

3.8 系统易用性

进行角色逻辑、业务逻辑、时间逻辑细化梳理，结合不同类型、不同承接主体的项目管理要求，设定相应页面，对功能进行排布，以便更好地与管理要求相适应。

四、施工管理

4.1 技术交底（一阶段上线功能）

包括设计交底、方案交底、专项交底。方案交底流程和OA中的方案内审关联（从OA中推送已完结的流程数据）。

（1）系统位置

原系统位置：建设管理-施工管理-技术交底

新系统位置：施工管理-技术交底

(2) 表单

1) 原样保留字段: 交底主题、交底单位、交底时间、主要内容、备注、附件上传(交底照片、交底签到表)

2) 调整字段: 工程名称(改为项目名称, 只能从项目库中进行选择, 不能输入。)、交底编码(同一个项目, 按照交底类型+三位顺序号, 由系统自动生成, 设计交底 SJ/方案交底 FA/专项交底 ZX, 例: SJ-001)、主持人(改为交底人, 可以多选)、参与人员(改为被交底人, 可以多选)。

3) 增加字段: 交底类型(下拉菜单, 选项包括设计交底、方案交底、专项交底; 必填项, 默认为空。)

如为方案交底, 关联选择从 OA 推送的已内审完成的方案。方案列表可以显示是否已完成交底。方案交底提醒: 在 OA 上完成项目方案内审后, 自动推送至本平台, 并提醒进行方案交底。

(3) 流程

发起人-技术负责人/项目经理(-交底人/被交底人(会签))-发起人)

4.2 施工日志(一阶段上线功能)

由施工单位的施工管理人员填写, 每位施工员填写自己的日志, 填写模板做进表单中(可导出为 word 文档, 支持单项导出和批量导出), 同时方便进行打印。保留上传附件接口, 支持填写纸质版拍照上传。

(1) 系统位置

原系统位置: 建设管理-施工管理-施工日志

新系统位置：施工管理-施工日志

(2) 表单

按照附件 2《施工日志模板》设置填写表单栏，每项都为必填。其中，日期只能选时限范围内的（如设置为 7 天，则为当天以及之前的 6 天）。或者系统每天一早定时推送当天待填写的施工日志，只能看到和填写时限范围内的内容；编号在项目开始时进行设置，后续由系统自动生成顺序号（如合同号-施工人员姓名简称-三位流水号）；工程名称只能从项目库中进行选择，不能输入；天气、气温、风力等，根据项目定位从气象台直接抓取，同时支持修改；记录人只能是登录账号的本人，不能选择或输入。需支持影像记录上传，上传照片可以对应填写说明文字。填写后的表单，可导出为 word 文档，文档格式参照附件 1，文档应包含施工员和技术负责人的电子签名。上传的照片也应可以一并导出并打印。

辅助内容填写：自动拉取前一天的填写内容；结合智慧工地系统，实现部分字段自动填充，如通过工地门禁系统自动获取“当日进场施工人数”，自动获取当地天气数据，通过施工设备传感器获取“主要施工机械运行时长”等。

(3) 流程

发起人（设置时限，发起人只能发起符合时限要求日期的流程）-技术负责人（流程完结后自动归档。）

4.3 项目信息发布

可发布通知、工作规定、会议纪要等，分为对内发布和

对外发布，对内发布只有本公司项目管理人员可查看，对外发布同时开放给其他项目相关方。可通过设置不同的信息发布类型，分别进行管理，查看清单支持筛选。发布内容查看后留痕，显示已读。

(1) 系统位置

施工管理-项目信息发布

(2) 表单

发起人、发布时间、项目名称(从项目库中选择)、编号、发布内容(支持全文粘贴和上传附件)、发布范围(内部/外部，必选项，默认为“内部”)、发布类型(通知/工作规定/会议纪要等)。

(3) 流程

发起人(项目管理人员)-审批(项目经理)。

4.4 图纸分发

建立图纸分发系统，面对所有分包方、联合体其他方等(的项目经理)开放下载，针对每一条记录，可查看哪些单位已下载。支持批量下载。

(1) 系统位置

施工管理-图纸分发

(2) 表单

发起人、发布时间、项目名称(从项目库中选择)、编号、图纸版本、版本更新说明(支持全文粘贴和上传附件)、附件(包括图纸压缩包，以及版本说明，压缩包内的版本号及更新时间等关键信息应与压缩包名称保持一致)。

(3) 流程

发起人(设计负责人)-审批(项目经理)。

4.5 收文

与业主、监理、分包方及其他相关方的收文记录。

(1) 系统位置

施工管理-收文

(2) 表单

发起人、收文时间、项目名称(从项目库中选择)、编号、收文内容、发文单位(从项目相关方中选择)、交办管理人员(默认为空,从公司项目管理人员库中选择,选择后形成审批节点)、处理时限(到期前2天发送提醒)、附件。

(3) 流程

发起人(项目管理人员)-审批人(项目经理)-交给相关管理人员(选择后形成节点)。

4.6 发文

与业主、监理、分包方及其他相关方的发文记录。通过设置发文类型,可区分不同的函件、通知单、指令单等。

(1) 系统位置

施工管理-发文

(2) 表单

发起人、发文时间、项目名称(从项目库中选择)、编号、发文内容、收文单位(分包方项目经理关联的单位)、分包方项目经理(默认为空,从项目相关方人员库中选择,选择后形成审批节点,可多选,类似会签)、发文类型、附件。

(3) 流程

发起人（项目管理人员）-审批人（项目经理）-分包方项目经理（选择后形成节点）。

4.7 维保整改记录

形成维保整改记录，可以指派工作，并形成整改闭环。

(1) 系统位置

施工管理-维保整改记录

(2) 表单

发起人、发起时间、项目名称（从项目库中选择）、编号、维保内容、维保单位（维保实施方项目经理关联的单位）、维保实施方项目经理（默认为空，从项目相关方人员库中选择，选择后形成审批节点）、整改时限（到期前 2 天发送提醒）、附件。

(3) 流程

流程：发起人（维保工程师）-审批人（项目经理）-分包方项目经理（选择后形成节点）-维保工程师

4.8 人员考勤

实现对项目管理人员以及分包单位主要管理人员的考勤，包括项目经理、安全员等。可以设置需要考勤的人员，支持按项目、单位、人员等方式筛选查询考勤情况，并下载考勤数据。支持以下两种考勤方式：

(1) 依托于实名制系统

项目如已建设或计划建设智慧工地，则可依托于其实名制系统。建设之前需要提前沟通，数字技术公司给一些标准，

以便后期可以接入。

(2) 平台预置 APP 定位打卡功能,同时支持多各施工点位打卡。

4.9 设计变更

(1) 系统位置

原系统位置: 无

新系统位置: 施工管理-设计变更

(2) 表单

发起日期: 系统默认发起当天时间;

发起人: 系统默认操作人员为发起人, 我司对应设计负责人或设计协调人员;

项目名称: 从项目库中选择

变更单编号: 项目合同号+JG001, 系统按顺序连续编号;

变更名称: 简要描述变更事项

预估金额(元)(非必填项): 根据附件中测算明细进行填写;

变更原因: 根据实际原因进行填写;

变更详情说明: 对变更涉及的事项做详细描述填写;

分包合同编号、分包合同名称: 此变更关联的分包, 从 OA 推送已生效的分包合同清单, 在清单中进行选择, 由项目经理选择, 可多选;

相关附件: 包括不限于变更图纸、测算明细、分包单位报送明细、甲方指令等。

上述均为必填项。

(3) 流程

发起人（我司设计负责人或设计协调人员）→ 造价人员
（我司项目现场造价人员）→ 项目经理

五、质量管理

5.1 质量巡检（一阶段上线功能）

分为日常巡查、周巡查、月巡查、专项巡查。可以方便地用手机生成新的条目，附图和说明文字。可指定整改单位和整改人，可进行整改情况的闭合。

(1) 系统位置

原系统位置：建设管理-质量管理-巡检管理

新系统位置：质量管理-质量巡检

(2) 表单

1) 原样保留字段：项目名称、巡检周期、巡检日期、巡检名称、协作人、整改单位。

2) 调整字段：公司名称（只能是登录账号的本人对应的公司，不能选择或输入。）、主巡人（只能是登录账号的本人，不能选择或输入。）、整改责任人（只能在选定的整改单位的人员名单中选择）、质量巡检明细（流程节点①可添加1条或多条明细，填写内容包括巡检部位、问题描述、图片（可上传并显示）、整改周期、整改状态（默认为待整改）。流程节点②整改责任人可以针对每一条明细进行回复，填写整改描述，并附图。流程节点③发起人确认每一条记录的整改状态（待整改/整改完成）。）

(3) 流程

①发起人-技术负责人/项目经理-协作人-②整改责任人(上传整改记录)-③发起人(确认整改状态)。

系统应具备提示功能,如发起后超过一定周期(如7天),或超出巡检明细中填写的整改周期,流程未闭合的,每天提示发起人和整改责任人,直到流程闭合。

5.2 验收管理

对项目竣工验收,以及主要的分项验收、分部验收,形成记录,留存资料。

(1) 系统位置

原系统位置: 无

新系统位置: 质量管理-验收管理

(2) 表单

工程名称(只能从项目库中进行选择,不能输入。),验收类别(分项验收、分部验收、竣工验收/终验收、出厂验收/到货验收)、验收内容(填写)、验收日期、验收资料上传。

(3) 流程

发起人-确认人(项目经理)

5.3 设备监造

形成设备监造过程记录。在项目启动阶段对各分包方的监造时间节点进行初始设置,添加监造设备,设定好各监造设备每阶段的计划完成日期,系统到期提醒。

(1) 系统位置

原系统位置: 无

新系统位置: 质量管理-设备监造

(2) 表单

1) 发起人(只能是登录账号的本人,不能选择或输入。)、发起时间、发起日期、编号、分包方(只能是登录账号的本人对应的公司,不能选择或输入。)、项目名称(只能从项目库中进行选择,不能输入。)、监造设备(从初始设置中选择)、监造阶段(设计会签/外购件采购/设备装配/调试/出厂验收)、监造内容描述、计划完成日期(从该项目该分包方的初始设置中提取,不可修改)、实际完成日期(填写,应和附件中的记录保持一致)、备注、附件。

2) 初始设置内容:选择项目,选择分包方,添加监造设备(可以以进度相同的一批次为单位),设置各监造设备的监造阶段时间节点,包括设计会签*、外购件采购、设备装配、调试、出厂验收(内部)*五个节点,其中设计会签、出厂验收为必填项。

(3) 流程

发起人(分包方项目经理)-确认人(项目经理)

5.4 调试记录

形成调试记录。上传单机调试

设备监造过程记录。在项目启动阶段对各分包方的监造时间节点进行初始设置,添加监造设备,设定好各监造设备每阶段的计划完成日期,系统到期提醒。

(1) 系统位置

原系统位置:无

新系统位置:质量管理-调试记录

(2) 表单

1) 发起人(只能是登录账号的本人,不能选择或输入。)、发起时间、发起日期、编号、项目名称(只能从项目库中进行选择,不能输入。)、调试类型(单机调试/联动调试)、调试内容描述(描述具体调试的设备、系统等)、调试完成日期、分包方(从项目相关方中选择,可多选)、附件。

(3) 流程

发起人(项目管理人员)-确认人(项目经理)

5.5 样板管理(建设单位/监理单位等相关方共同参与)

可对样板进行记录和确认。

(1) 系统位置

原系统位置: 建设管理-质量管理-样板引路

新系统位置: 质量管理-样板管理

(2) 表单

1) 原样保留字段: 样板名称、计划时间、主要材料、样板部位、描述、备注、样板附件、确认附件。

2) 调整字段: 项目名称(只能从项目库中进行选择,不能输入。)、单位名称(只能是登录账号的本人对应的单位,不能选择或输入。)、确认时间(实际确认时间,即流程完结时间,流程完结后写入)、实施单位(优先从项目相关方库中进行选择。如库中无此单位,可手动输入。)

(3) 流程

发起人(施工单位)-确认人(建设单位/监理单位/设计单位)。

系统应具备提示功能，如超过计划时间流程未闭合的，每天提示确认人，直到流程闭合。

5.6 见证取样（建设单位/监理单位等相关方共同参与）

形成见证取样记录，相关各方确认，并留存资料。

（1）系统位置

原系统位置：建设管理-质量管理-见证取样

新系统位置：质量管理-见证取样

（2）表单

1) 原样保留字段：取样时间、取样地点

2) 调整字段：项目名称（只能从项目库中进行选择，不能输入。）

3) 增加字段：发起人、取样单位（只能从项目相关方库中进行选择，不能输入。）

（3）流程

发起人（施工单位）-确认人（建设单位/监理单位）。

系统应具备提示功能，如超过计划时间流程未闭合的，每天提示确认人，直到流程闭合。

六、进度管理

6.1 形象进度

（1）系统位置

原系统位置：无

新系统位置：进度管理-形象进度

（2）表单

发起日期：系统默认发起当天时间；

发起人：登录系统的本人

项目名称：从项目库中选择

形象进度周期：周/月

本期计划完成产值（万元）：从上一期的流程中提取“下期计划完成产值（万元）”中的内容，不可修改。

本期实际完成产值（万元）：

截至上期累计完成产值（万元）：从上一期的流程中提取“截至本期累计完成产值（万元）”中的内容，不可修改。

截至本期累计完成产值（万元）：截至上期累计完成产值+本期实际完成产值

截至本期累计完成百分比：

本期计划：从上一期的流程中提取“下期计划”中的内容，不可修改。

主要形象进度：

进度偏差：

进度偏差原因：

拟采取的进度纠偏措施：

下期计划：

下期计划完成产值（万元）：

项目建设阶段：①工程总承包和施工总承包项目：地基基础阶段/主体阶段/装饰装修阶段/机电安装阶段/室外工程阶段，可多选；②设备总承包项目：工艺方案、设备基础提资/会签、设备设计/会签、分包采购、设备制造、出厂验收/到货验收、现场安装/调试、交付验收。

附件：可上传照片、其他附件等。

上述均为必填项。

(3) 流程

发起人（进度控制负责人）-确认人（项目经理）。

七、费控管理

7.1 现场签证

(1) 系统位置

原系统位置：无

新系统位置：费控管理-现场签证

(2) 表单

发起日期：系统默认发起当天时间；

发起人：系统默认操作人员为发起人，我司对应现场施工员；

项目名称：从项目库中选择；

分包合同编号、分包合同名称：从 OA 推送已生效的分包合同清单，在清单中进行选择；

签证单编号：分包合同号+QZ001，系统按顺序连续编号；

签证名称：简要描述签证事项

预估金额（元）：根据附件中测算明细进行填写；

签证原因：根据实际原因进行填写；

签证详情说明：对签证涉及的事项做详细描述填写；

相关附件：包括不限于图纸、测算明细、分包单位报送明细、甲方指令等。

上述均为必填项。支持填写后生成签证单，可以打印签

字。

(3) 流程

发起人（我司对应专业现场施工员或施工管理人员）→
造价人员（我司项目现场造价人员）→项目经理

八、安全管理

8.1 安全管理组织机构

安全管理组织机构由项目经理、技术负责人、项目安全员和分包单位安全员组成。由项目安全员录入人员名称及证件情况。列表可查看机构人员配置情况。

参照喀什建管平台“建设管理-项目管理-项目人员-通讯录”，在安全管理中增加安全管理组织机构。岗位字段为组长、副组长、组员。增加附件上传端口，上传安全证件。

新增信息

工程名称: 请选择

* 单位名称: 请选择

* 姓名: 请输入姓名

* 岗位: 请选择

* 身份证号: 请输入身份证号

* 电话: 请输入电话

是否添加账号: 是 ☐ 否 ☐

描述: 请输入描述

保存 返回


流程：项目安全员选择安全管理组织机构→点击岗位录入人员名称、岗位、上传证件→保存。

8.2 安全生产责任制

以列表形式展示项目人员，点击具体人员可以查看安全生产责任书和当月安全生产责任制考核记录。列表可查看未签订安全生产责任书的人员以及当月未上传安全生产责任

制考核记录。

参照喀什建管平台“建设管理-安全管理-安全生产责任制”，下设两个子项**安全生产责任书**和**安全生产责任制考核记录**。

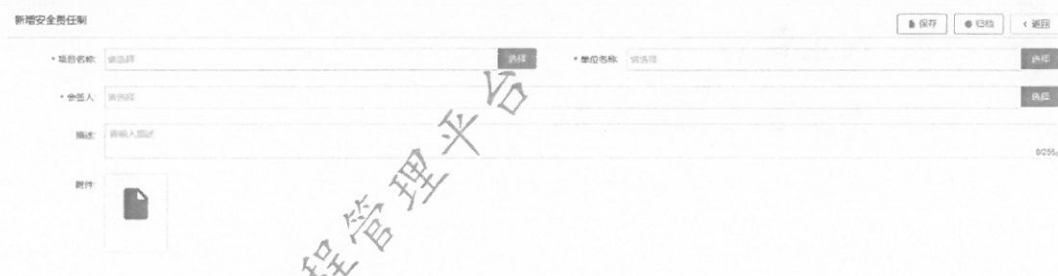

进入**安全生产责任书**，可以选择新增上传每个项目角色的**安全生产责任书**。

流程：项目安全员点击**安全生产责任书**→选择**新增**→完善项目、人员信息并上传**安全生产责任书**→保存。

进入**安全生产责任制考核记录**，可以选择新增上传每个项目角色的当月**安全生产责任制考核记录**。

流程：项目安全员点击**安全生产责任制考核记录**→选择**新增**→上传被考核人当月**安全生产责任制考核记录**→保存。

8.3 安全教育（一阶段上线功能）

分为入场安全教育、专题安全教育、管理人员教育。由施工单位的安全员选择发起，可以在移动端生成新的条目，上传图片 and 文字说明（设置四个上传端口：教育时间、教育照片、教育记录表、文字说明）。

参照喀什建管平台“建设管理-安全管理-安全教育”，在新增界面增加**安全教育类型**字段选项，（入场安全教育、专题安全教育、管理人员教育）

流程：安全员选择发起安全教育→填报教育类型、教育时间、教育单位、教育内容并上传教育照片和教育记录表→保存。

8.4 安全技术交底（一阶段上线功能）

由施工单位的施工管理人员发起，可以在移动端生成新的条目，上传图片 and 文字说明。（设置四个字段：交底时间、交底照片、交底记录表、文明说明）。

参照喀什建管平台“建设管理-安全管理-安全交底”，增加**接受交底单位**（可以手动输入单位名称），在录入环节结束后抄送至安全员确认。

流程：项目施工员选择发起安全交底→填报交底时间、接受交底单位和交底内容上传交底照片和交底记录表→保存→安全员确认。

8.5 安全验收

在安全管理中新增“安全验收”子项。

安全验收分为机械设备进场验收、安全物资进场验收、分部分项工程验收，验收人发起申请，可以上传图片和文字说明。

其中**机械设备进场验收**和**安全物资**设置四个字段：

- ① 验收时间
- ② 验收内容（文字说明）
- ③ 验收照片
- ④ 附件：相关证明材料（pdf、word 或图片格式）。

分部分项工程验收设置三个字段：

- ① 验收时间
- ② 验收内容（文字说明）
- ③ 验收照片

流程：验收人员选择验收类型发起验收→验收人员填报验收时间、验收部位和内容、上传验收照片、上传相关证明材料（仅机械设备验收和安全物资验收需要）→验收结论→保存。

8.6 安全巡检（一阶段上线功能）

分为日常安全巡查、周安全巡查、专项巡查。进入界面展示巡查隐患列表，列表内容包括隐患清单，清单上展示超

期、隐患整改闭环等信息。列表可查看隐患类型和频次。

参照喀什建管平台“安全巡检管理”，增加安全员复查隐患流程，复查不通过时，流程返回至整改人重新整改。

流程：安全员选择检查类型发起巡查→安全员上传隐患、归属单位、整改要求以及整改时限、指定整改责任人→整改责任人上传整改记录→安全员复查隐患→结束。

安全巡查推送分包，显示是否已读。

8.7 特种作业人员管理

以列表形式展示项目特种作业人员台账，由项目安全员填报，人员基本信息（包含姓名、单位、证书编号）和证书查验记录及特种作业人员教育交底记录，保存后进入项目特种作业人员库，后续可直接根据名称和证书选择。

参照喀什建管平台“建设管理-项目管理-特种证书”，将附

修改信息

* 证书名称	建筑架子工	* 证书编号	鄂C022025005173
* 证书类型	建筑架子工	* 颁发单位	湖北省住房和城乡建设厅
* 有效期开始日期	2025-02-18	* 有效期结束日期	2027-02-18
* 人员姓名	向连松	选择	
附件			
描述	请输入描述		

件上传端口设置为 3 个必填项，分别为特种作业人员证件电子件、证件查验记录、特种作业人员教育交底记录。

流程：项目安全员选择新增特种作业人员→填报人员基本信息（姓名、单位、证书编号）、上传证书照片、查验记录

截图、特种作业人员教育交底记录→保存。

8.8 安全日志

基础信息+标准模版填报，由项目安全员每日在系统 APP 填写或上传纸质安全日志照片，可统计填写频次、填写率和查看未填写日期，填写 3 日后锁定，不允许修改和后补。

参照喀什建管平台“建设管理-安全管理-施工安全日志”，内容按以下重庆市日志标准模版修改字段。

施工安全日志

项目名称: [输入框] 选择 [按钮] 施工单位: [输入框] 选择 [按钮]

监理单位: [输入框] 选择 [按钮] 日期: 2025-07-11 天气: 晴

项目负责人: [输入框] 选择 [按钮] 项目安全员: [输入框] 选择 [按钮] 专职安全管理人员: [输入框] 选择 [按钮]

描述: [输入框]

附件: [上传按钮]

[保存] [取消]

基础信息：沿用喀什建管平台。

标准模版：

- 一、工程施工部位及施工进度情况
- 二、当日主要危险性项目作业内容
- 三、施工项目安全教育与安全交底情况
- 四、施工作业队伍班前施工安全活动情况
- 五、现场施工安全巡视与检查情况
- 六、季节施工防寒、防暑等措施实施情况
- 七、监理通知或有关部门安全检查情况
- 八、停工、加班情况
- 九、其他应记录的安全与文明施工事项。

辅助内容填写：自动拉取前一天的填写内容；结合智慧

工地系统，实现部分字段自动填充，如通过工地门禁系统自动获取“当日进场施工人数”，自动获取当地天气数据，通过施工设备传感器获取“主要施工机械运行时长”等。

流程：项目安全员选择**安全日志**→填报基础信息，根据标准模版填报逐项填报内容（也可以上传安全日志纸质照片）→保存。

8.9 危大工程

项目安全员录入项目的危大工程清单，以列表形式展示危大工程清单。单项危大工程需包含以下流程内容。

参照喀什建管平台“建设管理-安全管理-危大工程”，设立子项**工程判定**、**过程管理**、**监测**、**工程验收**。

工程判定参考喀什建管平台“建设管理-安全管理-危大工程-工程判定”即可。



流程：项目安全员选择危大工程中的**工程判定**→选择**新增**→选择判定类别、填写判定时间和危大和超危大工程数量并上传纸质判定附件→保存。

过程管理参考喀什建管平台“建设管理-安全管理-危大工程-辨识清单”，创建危大工程的清单表。

新增危大工程辨识清单

项目名称: [输入框] 选择 公司名称: [输入框] 选择

项目编号: [输入框]

工程状态: [下拉菜单: 未开工] 工程等级: [下拉菜单: 特级重大工程等级]

工程类别: [下拉菜单: 新建房屋建筑工程] 实施阶段: [下拉菜单: 设计阶段]

具体工程部位: [下拉菜单: 新建房屋建筑工程] 当前实施阶段: [下拉菜单: 设计阶段]

危险源识别风险: [输入框] 形象进度: [输入框]

记录时间: 2025-07-14 [计划开始时间: 选择计划开始时间] [计划结束时间: 选择计划结束时间]

描述: [输入框]

备注: [输入框]

附件: [文件上传图标]

“危大工程等级”为危大工程设置 3 个附件上传口(审批通过后的专项施工方案、危大工程交底记录表(方案)、危大工程交底记录表(安全技术));

危大工程流程: 项目安全员选择危大工程中的过程管理 → 选择新增 → 选择危大工程类别和等级、填写工程具体部位、实施阶段和风险参数、计划实施的起止时间并上传审批通过后的专项施工方案、危大工程交底记录表(方案)、危大工程交底记录表(安全技术) → 保存。

“危大工程等级”为超危大工程设置 4 个附件上传口 (① 审批通过后的施工方案、② 危大工程交底记录表(方案)、③ 危大工程交底记录表(安全技术)、④ 危大工程安全专项施工方案专家论证审查表)

超危大工程流程: 项目安全员选择危大工程中的过程管理 → 选择新增 → 选择危大工程类别和等级、填写工程具体部位、实施阶段和风险参数、计划实施的起止时间并上传审批

通过后的专项施工方案、危大工程交底记录表(方案)、危大工程交底记录表(安全技术)、危大工程安全专项施工方案专家论证审查表→保存。

工程验收参考喀什建管平台“建设管理-安全管理-危大工程-工程验收”，设置2个附件上传口(①危大工程验收表)，从过程管理的危大工程清单表中选择相应的危大工程发起验收。

验收流程：项目安全员选择危大工程中的工程验收→选择**新增**→在**单据名称**汇总选择需验收的危大工程和**危大工程类别和等级**、填写**工程具体部位**、**验收部位**、**验收内容**、**验收时间**、**验收结果**并上传**危大工程验收表**→保存。

8.10 应急管理

分为应急小组、应急物资板块内容。应急小组由项目安全员建立词条录入人员信息。应急物资由项目安全员建立词条录入物资信息。

在安全管理中新增“应急管理”，下设**应急小组**和**应急物资**子项。

进入**应急小组**，可以选择添加“XX小组”字段，并录入小组组长及成员名称。

流程：项目安全员选择应急管理→选择应急小组→建立各个小组→录入小组组长及成员→保存。

进入**应急物资**，可以录入物资种类、数量及存放地点字段，

流程：项目安全员选择应急管理→选择应急物资→录入物资种类、数量及存放地点→保存。

8.11 带班管理

带班管理设立子项**带班生产**、**带班检查**。

带班生产：根据标准模版逐项填报，由项目经理每日在系统 APP 填写或上传纸质带班记录照片，可统计填写频次、填写率和查看未填写日期，填写 3 日后锁定，不允许修改和后补。

参照喀什建管平台“建设管理-施工管理-带班记录”，内容按以下重庆市带班生产模版修改字段。

基础信息：沿用喀什建管平台。

标准模版：

一、行为管理

- 二、文明施工
- 三、脚手架
- 四、基坑支护
- 五、模板工程
- 六、安全三包及洞口防护
- 七、施工用电
- 八、施工升降机(人货两用电梯)
- 九、塔吊
- 十、施工机具
- 十一、隧道工程
- 十二、其他

带班生产流程：项目经理选择带班生产→根据标准模版选择填报内容→保存。

带班检查流程：企业或部门领导选择带班检查→根据标准模版选择填报内容→保存。

8.12 分包安全管理

分包安全管理设立子项**分包台账**。进入**分包台账**界面展示分包单位信息列表。点击分包单位信息可以进入查看/编辑分包单位的安全生产许可证、企业资质、营业执照以及项目安全保险和项目经理、安全员的证件信息。

表单：分包名称(自行输入)、项目经理、安全员姓名(自行输入)、人员安全证件上传端口(必填项)、安全生产许可证、企业资质、营业执照、项目安全保险4个上传端口(非必填项)。

流程：选择分包安全管理→点击分包台账→选择建立分包单位信息→录入分包单位名称、分包单位项目经理/安全员姓名，上传附件（安全生产许可证、企业资质、营业执照、项目保险、项目经理/安全员安全证件信息）→保存。

8.13 高风险作业

进入高风险作业界面展示高风险作业许可记录台账。点击记录可以查看详细信息。由分包单位的项目经理或安全员选择发起高风险作业申请，推送至项目部项目经理、施工员/施工经理和安全员审批。

表单：高风险作业类型（下拉菜单，选项包括动火作业、有限空间作业、吊装作业）。

（1）动火作业审批表单（均为必填项）：作业名称（自行输入）、动火部位（自行输入）、动火时间（自行选择时段，不超过7天）、申请动火理由（自行输入）、作业人员姓名（从8.7项目特种作业人员库中选择）、监护人姓名（自行输入）、申请动火人（默认填写人）、申请时间（默认填写时间，不允许自行输入）。

（2）有限空间作业审批表单（均为必填项）：项目名称（自行输入）、作业班组（自行输入）、作业地点（自行输入）、作业内容（自行输入）、主要危险有害因素（自行输入）、作业人员（从8.7项目特种作业人员库中选择）、监护人员（从8.7项目特种作业人员库中选择）、作业时间（自行选择时段，不超过12小时）、主要安全措施（以下6点需勾选）：①已开展有限空间作业安全技术交底。②作业人员、监护人员已确

定,且培训合格。③有限空间通风、气体准入检测满足要求。④现场防护、个体防护装备、应急救援装备满足要求。⑤已编制应急预案并开展交底。⑥其他情况。申请人(默认填写人)。

(3) 吊装作业审批表单(均为必填项): 项目名称(自行输入)、作业班组(自行输入)、作业地点(自行输入)、吊装内容(自行输入)、主要危险有害因素(自行输入)、起重司机(从8.7项目特种作业人员库中选择)、信号工(从8.7项目特种作业人员库中选择)、作业时间(自行选择时段,不超过24小时)、主要安全措施(以下6点需勾选): ①方案编制、审批齐全,作业人员已接收安全教育和书面交底。②起重吊装操作人员、指挥人员持证上岗,个人防护用具、指挥用具配备齐全有效。③起重机械验收合格,吊索具检查合格。④作业场地平整,已设置警戒区域并进行警示,夜间照明充足。⑤与架空输电线路的安全距离符合要求。⑥严格执行起重机械安全操作规程。申请人(默认填写人)。

流程: 分包单位项目经理或安全员选择发起高风险作业申请→项目部施工员/施工经理审核→项目部安全员核查→项目经理批准。

8.14 环境、安全风险管

环境、风险管理设立子项安全风险分级、四个清单。进入安全风险分级、四个清单界面可以查看清单台账,按月份排列,未填写月份标红。

风险分级:

按照附件 3《建筑施工现场安全风险分级管控清单》的模板设置填写表单栏，每项均为必填项。填写频次为每月，填写 3 日后锁定，不允许修改和后补。

四个清单：

按照附件 4《危险源辨识、风险和机遇评价及风险控制措施的策划规定（表单）》和附件 5《环境因素的识别与评价管理规定（表单）》的模板设置填写表单栏，每项均为必填项。填写频次为每月，填写 3 日后锁定，不允许修改和后补。

流程：发起人（安全员/技术负责人）→填写当月表单→保存。

九、材料、设备及物资管理

对材料、设备及项目现场物资进行管理，并形成台账，可随时查询库存状态。其中，材料、设备指的是用于形成工程实体的物料，项目现场物资指的是用于现场管理和作业的辅助物资，如全站仪等设备，现场办公用品等。

9.1 材料设备进场验收及入库

形成材料设备进场验收及入库记录。支持Excel导入（基于标准物料库）。

（1）系统位置

原系统位置：建设管理-质量管理-材料进场（线下报审）

新系统位置：材料设备进场验收及入库

（2）表单

1) 原样保留字段：材料进场报审表上传（必填项）、（以下都为非必填项）材料进场验收表上传、合格证上传、出厂

检验报告上传、型式检验报告上传、其他文件上传、备注、存放地点。

2) 调整字段：项目名称（只能从项目库中进行选择，不能输入。）、进场时间（精确到上午/下午/晚上）、描述（改为进场材料描述，必填项）。

3) 增加字段：收货人（只能是登录账号的本人，不能选择或输入。）、收货单位（只能是登录账号的本人对应的公司，不能选择或输入。）、分包合同编号、分包合同名称（从OA推送已生效的分包合同清单，在清单中进行选择）、是否入库（必填项，默认为是）、是否同步出库（必填项，默认为否）、领用人（如果“是否同步出库”为“是”，则填写领用人，必填项）、材料/设备领用单上传（如果“是否同步出库”为“是”，则需上传。系统支持打印带明细的领用单，双方签字）、是否项目现场物资（必填项，默认为否）。

4) 删除字段：材料类型、是否取样。

5) 材料设备明细表：可在标准物料库中选择，并填写入库数量。

(3) 流程

发起人（收货人/材料员）—审核人（库管人员）

9.2 材料设备出库

形成材料设备出库记录。

(1) 系统位置

原系统位置：无

新系统位置：材料设备出库

(2) 表单

1) 项目名称 (只能从项目库中进行选择, 不能输入。)、领用时间 (精确到上午/下午/晚上)、领用人 (只能是登录账号的本人, 不能选择或输入。)、领用单位 (只能是登录账号的本人对应的公司, 不能选择或输入。)、出库材料/设备描述、备注、材料/设备领用单上传 (系统支持打印带明细的领用单, 双方签字)、其他文件上传 (非必填项)。

2) 材料设备明细表: 可在库存材料设备中选择, 并填写出库数量, 出库数量应小于等于库存数量。

(3) 流程

发起人 (领用人) - 审核人 (库管人员)

9.3 物资领用

形成项目现场物资的领用记录。

(1) 系统位置

原系统位置: 无

新系统位置: 物资领用

(2) 表单

1) 项目名称 (只能从项目库中进行选择, 不能输入。)、领用时间 (精确到上午/下午/晚上)、领用人 (只能是登录账号的本人, 不能选择或输入。)、领用单位 (只能是登录账号的本人对应的公司, 不能选择或输入。)、领用物资描述、备注、物资领用单上传 (系统支持打印带明细的领用单, 双方签字)、其他文件上传 (非必填项)。

2) 物资明细表: 可在库存物资中选择, 并填写领用数量,

领用数量应小于等于库存数量。明细表中可逐项勾选“是否需退还”。

(3) 流程

发起人(领用人)-审核人(库管人员)

9.4 物资退还

形成项目现场物资的退还记录。

(1) 系统位置

原系统位置: 无

新系统位置: 物资退还

(2) 表单

1) 项目名称(只能从项目库中进行选择,不能输入。)、领用时间(精确到上午/下午/晚上)、退还人(只能是登录账号的本人,不能选择或输入。)、退还单位(只能是登录账号的本人对应的公司,不能选择或输入。)、退还物资描述、备注、物资退还单上传(系统支持打印带明细的退还单,双方签字)、其他文件上传(非必填项)。

2) 物资明细表: 可选择物资领用流程,带出领用的物资明细表及领用数量,在此处填写退还数量。退还数量应小于等于领用数量。

(3) 流程

发起人(退还人)-审核人(库管人员)

9.5 项目物料台账

形成项目物料台账,随时能查询项目物料库中的库存情况,可进行汇总分析。

(1) 系统位置

原系统位置：无

新系统位置：项目物料台账

(2) 表单

显示物料库存明细。可根据关键字（项目、物料名称、分包合同）和物料类型（物资、非物资）进行筛选。支持整体导出。

(3) 流程

无

9.6 物料库维护

在系统上线运行前，建立工程标准物料库，包含物料名称、规格型号、单位等标准化信息，覆盖建筑工程常见的材料、设备、物资等。

同时建立本流程，支持手动维护物料库，可添加当前物料库中没有的材料设备及物资，包括物料名称、规格型号、单位、物资/非物资等信息。支持批量导入。

(1) 系统位置

原系统位置：无

新系统位置：物料库维护

(2) 表单

1) 发起人（登录账号的本人）、发起时间、备注。

2) 物料明细表：包括物料名称、规格型号、单位、物资/非物资等信息。支持批量导入。

(3) 流程

发起人（发起人待定）-审核人（后台管理人员）

9.7 物料盘点

形成物料盘点记录，适用于定期或不定期，以及部分或全部物料的盘点。如存在损耗或其他情况，导致盘点数量和库存数量不符，则在本流程中进行确认，修改库存数量，并说明原因。

（1）系统位置

原系统位置：无

新系统位置：物料盘点

（2）表单

1) 盘点人（登录账号的本人）、盘点时间、项目名称（从项目库中选择）、备注（当盘点数量与库存数量不等时，需在备注中进行逐项说明）。

2) 物料明细表：可在库存物料中选择物料条目，表格中增加一栏“本次盘点数量”，默认为库存数量，可由盘点人修改，当数量与库存数量不等时，该单元格背景黄色填充。

（3）流程

发起人（库管人员）-审核人（项目经理）

9.8 物料报废

形成物料报废记录。

（1）系统位置

原系统位置：无

新系统位置：物料报废

（2）表单

1) 发起人(登录账号的本人)、报废时间、项目名称(从项目库中选择)、报废原因(必填项)。

2) 物料明细表: 可在库存物料中选择物料条目, 表格中增加一栏“本次报废数量”, 默认为 0, 可由发起人修改。

(3) 流程

发起人(库管人员) 审核人(项目经理)

十、印章管理

10.1 项目印章用印申请

(1) 表单

发起日期: 系统默认发起当天时间;

发起人: 登录系统的本人

项目名称: 从项目库中选择

项目印章名称: 显示项目绑定的项目印章, 如有多枚印章, 则需手动选择。项目印章数据来源于 OA 系统项目类印章台账(综合办公-印章管理)。

报送单位:

份数:

是否上传用印后的文件: 下拉菜单, 选项为“是/否”, 默认为空。

文件内容:

报送用途:

附件: 可上传附件。

上述均为必填项。

(3) 流程

发起人（项目管理人员）-确认人（项目经理）-印章保管人-发起人上传盖章文件（当“是否上传用印后的文件”选“是”。

10.2 嵌套在各业务流程中的项目印章用印

（1）表单

在平台所有流程中，加入统一的用印信息，用印信息内容如下（或者通过后台配置选定需要使用项目印章的流程）：

加盖项目印章：下拉菜单，选项为“是/否”，默认为空。
如选择“是”，则显示以下表单内容：

项目印章名称：显示项目绑定的项目印章，如有多枚印章，则需手动选择。项目印章数据来源于 OA 系统项目类印章台账（综合办公-印章管理）。

报送单位：

份数：

是否上传用印后的文件：下拉菜单，选项为“是/否”，默认为空。

文件内容：

报送用途：

上述均为必填项。

（2）流程

当“加盖项目印章”选“是”，则流程最后增加审批节点①印章保管人；当“是否上传用印后的文件”选“是”，则流程最后增加审批节点②发起人上传盖章文件。

10.3 项目印章用印台账

在此归集本项目的项目印章用印台账，数据来源有以下3个：①10.1 中用印申请流程；②10.2 中各业务流程包含的用印信息；③OA 系统中项目印章用印申请流程（生产管理-项目印章管理）。显示字段包括：流程来源、发起日期、发起人、项目名称、项目印章名称、报送单位、份数、是否上传用印后的文件、文件内容、报送用途、流程状态。支持批量导出。

十一、劳务管理

11.1 劳务管理

结合智慧工地实名制系统，记录进场人员的以下信息：姓名、身份证号、性别、年龄、工种、分包单位、分包合同编号、分包合同名称、工作时间（包括日期及当日时间段）、健康证。其中，除工作时间外，其他人员信息采取批量导入维护的方式，工作时间为智慧工地系统每日打卡数据记录留存（进出工地的打卡机记录，可体现进入时间和离开时间）。

人员信息批量导入流程：发起人（分包单位项目经理）-审核人（劳务员）-确认人（项目经理）。

十二、图片（视频）库

建立项目图片库，并通过打标签的方式，支持对图片进行分类和筛选。图片库按项目进行设置，进入该功能首先选择项目名称（从项目库中选择）。

图片上传方式：①支持从流程中获取图片（在流程中上传的同时，支持打标签。也可以后期到图片库打标签）；②支持直接在图片库上传图片。支持手机拍摄及上传图片。

支持对图片打标签（可用手机操作，可多选）。标签可后台维护，初步设定 10 个左右，在系统启用前定义完成。

图片支持按标签进行筛选（可多选），并支持筛选后批量下载。

支持视频上传，上传方式同图片，但需限制视频大小。视频不要求打标签，但需要能在库中查看。

十三、项目大屏

展示在建项目数量和危大工程数量，根据安全巡查情况在大屏实现预警与风险报警功能。大屏展示实时视频监控信息，移动端实现同步查看。支持智慧工地平台按要求接入本平台。

管理指挥中心：能看到公司承接项目的情况，以及部门承接项目的情况。

十四、数据看板

14.1 平台端数据看板

1) 在首页显示当前平台中所有项目的重要信息汇总。

2) 设置项目看板页面，展示本平台该项目的各项信息，同时展示调取 OA 系统中数据中台的项目汇总数据和明细数据，以及主要流程及其附件供查阅。（可与 OA 系统的看板展示方式保持一致）

14.2 OA 系统端数据看板

本平台形成的项目数据在 OA 系统生产管理板块的项目看板中同步展示，包括明细数据、汇总数据和相关流程及资料等。

